

Извещение
о проведении тендера
АО «Завод им. В.А. Дегтярева» проводит тендер на выполнение работ
по изготовлению и монтажу модульного блок-офиса на площадях корпуса «Польский»
на территории 1 промплощадки АО ЗиД

Срок окончания приема заявок: 18.10.2024г. 9-00.

Участником тендера может стать исполнитель, имеющий производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы для выполнения требуемых работ (предоставления услуг).

Для участия в тендере необходимо предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости выполнения строительно-монтажных работ на изготовление, доставку и монтаж блок - модуля в соответствии с техническим заданием (в том числе стоимости материалов), сроков выполнения, гарантийного срока и условий авансирования работ.

Перечень документов, которые должны быть приложены к коммерческому предложению:

1. Копия устава.
2. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 дней до ее представления.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации организации.
4. Копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе по месту ее нахождения.
5. Копия решения об избрании руководителя организации.
6. Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор (доверенность или приказ о назначении).
7. Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения с отметкой налогового органа.
8. Документ, подтверждающий членство СРО (при наличии).

Для индивидуальных предпринимателей:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения.
3. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 дней до ее представления.
4. Документ, подтверждающий членство СРО (при наличии).

В отдельных случаях может запрашиваться дополнительная информация (по отдельному запросу АО «ЗиД»)

Коммерческие предложения направлять: tender_sao@zid.ru

Для справок обращаться: 8 (49232) 9-11-64

Техническое задание

Заказчик АО «Завод и. В.А. Дегтярева»

1. Наименование работ: изготовление, доставка и монтаж модульного блок-офиса с электрической разводкой, системой вентиляции, системой кондиционирования по приложению №2

2. Условия финансирования: Б/н расчет с предоплатой (авансовый платеж) в объеме не более 50%, дальнейшие платежи по предоставленным актам на выполненные работы по форме № КС-2 и № КС-3. Окончательный расчет после выполнения всех работ по договору подряда.

3. Сроки выполнения работ: IV квартал 2024 г.

4. Качество работ:

4.1 Мероприятия по обеспечению качества

Все работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами (ФЗ, СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, ППБ и пр.)

4.2 Требования по безопасности

- Ответственность за соблюдением требований по охране окружающей среды, пожарной безопасности, безопасности производства строительных работ несет Подрядчик.

4.3 Требования заказчика к качественным, техническим характеристикам товаров, используемых при выполнении работ:

Все применяемые изделия и материалы подлежат обязательной сертификации. Паспорта, сертификаты и приложения к ним заверенные печатью подрядной организации передаются сотруднику технического надзора и контроля.


5. Гарантии качества работ:

5.1 Срок предоставления гарантии качества работ на результаты выполненных работ по договору должен составлять не менее 24 месяцев.


5.2 Предоставление гарантии качества - на весь объем выполненных строительно-монтажных работ.

Планировочное и архитектурное решение модульной конструкции


План 1 этажа

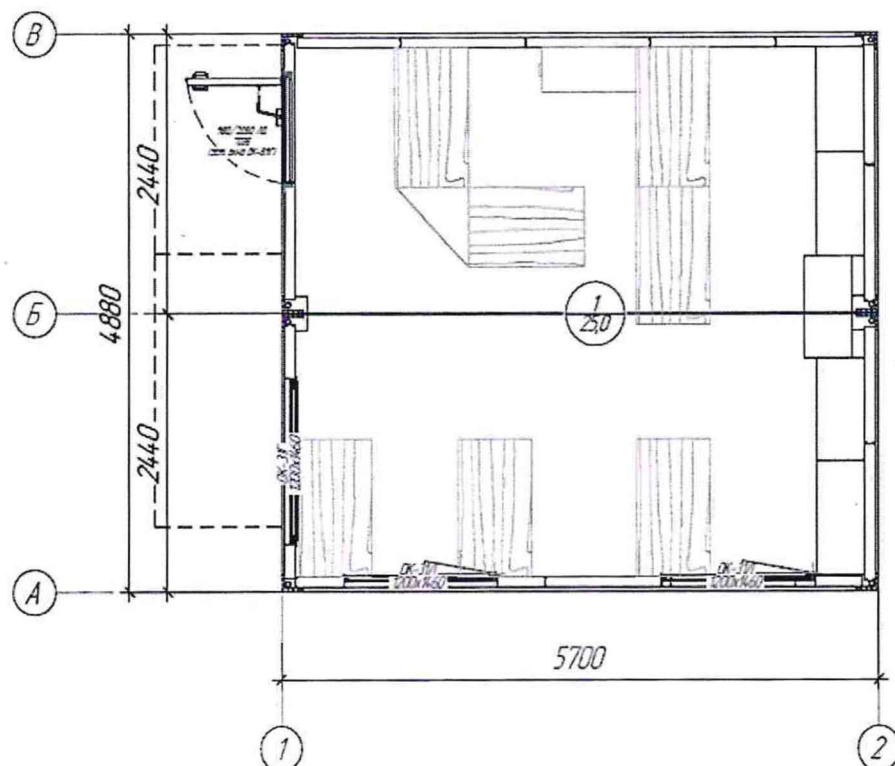


План 2 этажа

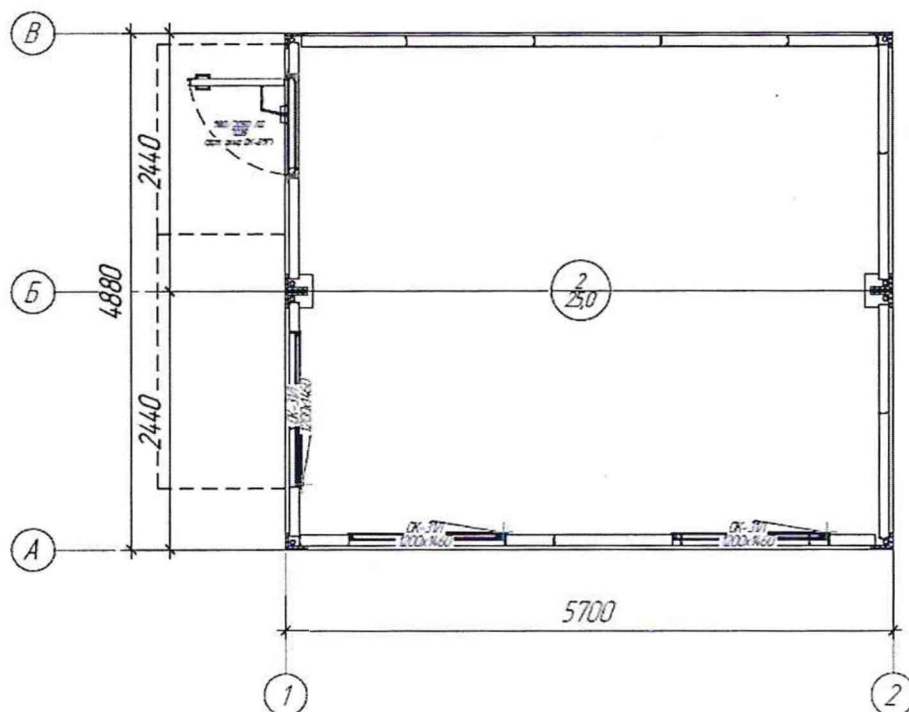

Фасад в/о А-В

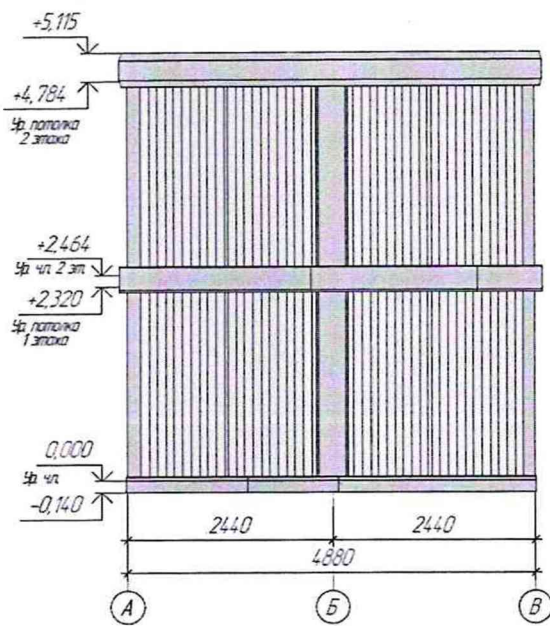


Фасад в/о В-А

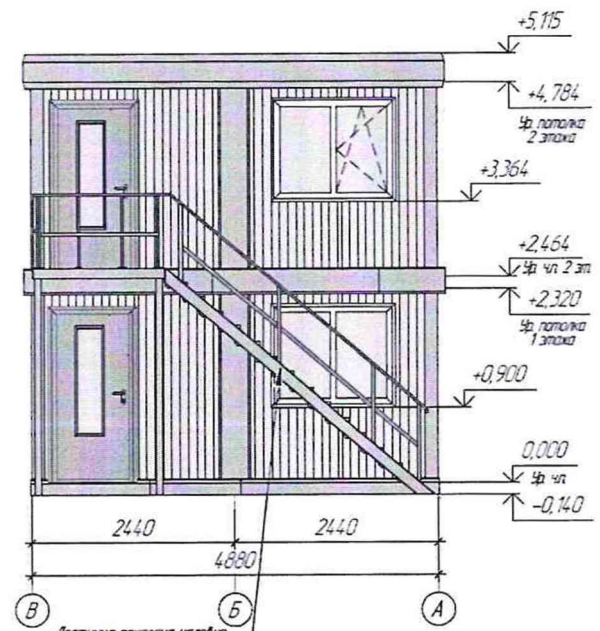


Лестница показана условно
может измениться вид
в ходе детальной проработки

Фасад в/о 2-1

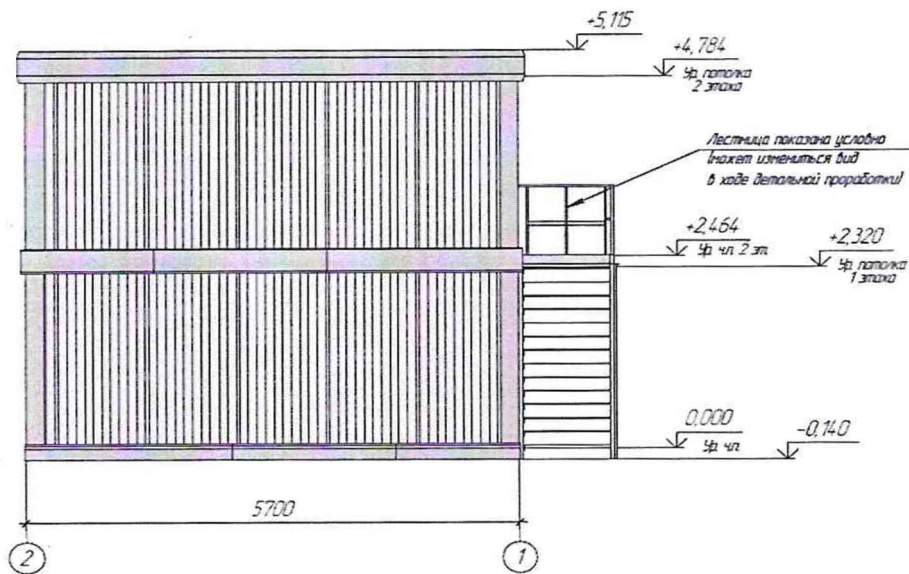

Фасад в/о 1-2

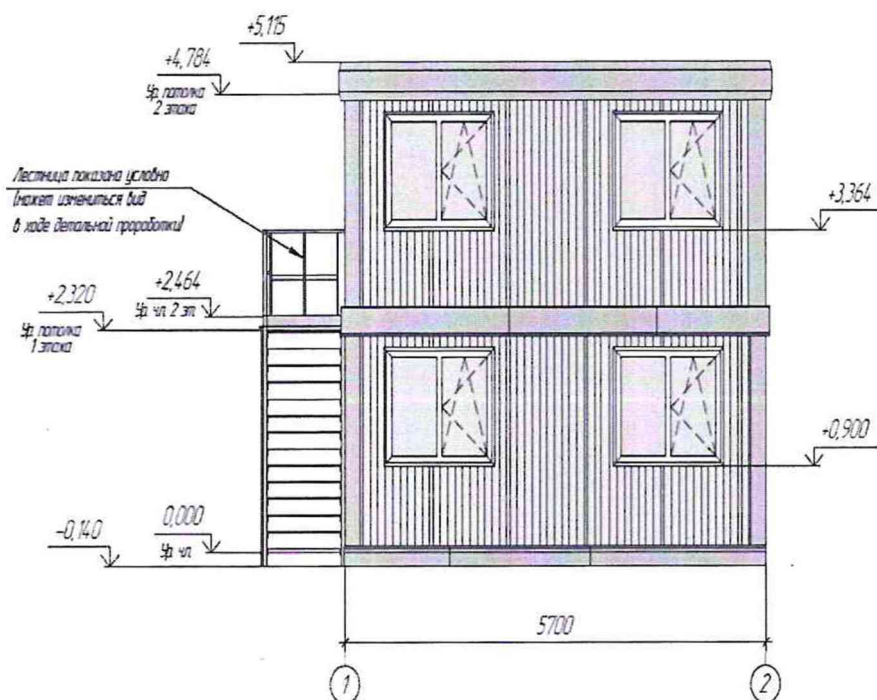

Краткое техническое описание и комплектация модульной конструкции

Комплект сборно-разборной модульной конструкции

Габаритные размеры – 6055 x 4880 мм

Этажность - 2

Внутренняя высота (пол-потолок) – 2320 мм*

Металлокаркас блок-модуля	Сборно-разборный металлический каркас, состоящий из сварных рам и несущих стоек, выполненных из сложного профиля. В конструкции каркаса отсутствуют деревянные элементы.
Конструкция утепленного пола этажа	Структура пола: сварная рамная металлоконструкция из сложного профиля, толщиной 3мм, с 4-мя опорными угловыми элементами толщиной 5мм, покрытие толщиной не менее 90мм, цвет RAL9002; - Стальные профилированные поперечные балки рамы пола выполнены из стали толщ 3мм; - Утеплитель минераловатная плита на основе базальта толщиной 100мм , между поперечными прогонами, с двухсторонней парозащитной пленкой 100мм; - Основное покрытие: ЦСП, 20мм; - Финишное покрытие: ПВХ (линолеум полукommerческий), толщиной 2,0мм;

Конструкция межэтажной рамы	Структура межмодульной рамы: сварная рамная металлоконструкция из сложного профиля, толщиной 3мм, с 4-мя опорными угловыми элементами толщиной 5мм, покрытие толщиной не менее 90мкм, цвет RAL9002; - Стальные профилированные поперечные балки рамы пола выполнены из стали толщ 3мм; - Утеплитель минераловатная плита на основе базальта толщиной 100мм, между поперечными прогонами, с двухсторонней парозащитной пленкой 100мкм; - Основное покрытие потолка: СМЛ толщиной 10 мм цвет белый - основное покрытие пола: ЦСП, 20мм; - Финишное покрытие пола: ПВХ (линолеум полукоммерческий) толщиной 2,0мм;
Конструкция утепленного потолка кровли	Структура потолка: сварная рамная металлоконструкция из о сложного профиля, толщиной 3мм, с 4-мя опорными угловыми элементами толщиной 5мм, покрытие толщиной не менее 90мкм, цвет RAL9002; - Утеплитель минераловатная плита на основе базальта толщиной 100мм, между поперечными прогонами, с парозащитной пленкой 80мкм. - Кровля: оцинкованный окрашенный (полимерное покрытие) стальной лист толщиной 0,5мм, завальцованный двойным фальцем по всей длине рамы и по контуру кровли; - Внешние силовые розетки типа ССИ утоплены в кровельной раме с торцевой стороны блок-контейнера - Финишное потолочное покрытие: СМЛ толщиной 10 мм цвет белый,
Угловые несущие стойки	- Сварная металлоконструкция из сложного профиля холоднокатаной стали толщиной 3 мм, болтовое соединение с нижней и верхней рамой, порошковая окраска, цвет RAL9002.
Стены	- Трехслойные сэндвич-панели заводского исполнения, толщиной 100мм , наполнитель минеральная вата, цвет RAL9002/9002, полимерное покрытие.
Внутренняя отделка	- гладкий металл с полимерным покрытием, RAL9002
Двери	Наружные: - В сборе, установленная в сэндвич-панель, двухстворчатая металлическая, размер дверного блока 980x2050мм, толщиной 60мм, полиэфирное покрытие, цвет RAL7035, в комплекте с замком «ключ-ключ», с накладными ручками, двухконтурный уплотнитель, доводчик. Предусмотрено остекление в ПВХ профиле.
Окна	- Окно ОК-31Л: в сборе с оконной рамкой установленное в сэндвич-панель, двухкамерный стеклопакет, ПВХ исполнение, одностворчатое, цвет белый, поворотно-откидное открывание одной створки, размером оконного блока 1200(н)x1460мм (6шт.) – согласно планировочного решения
Металло-конструкции	- Декоративный межмодульный и кровельный доборный элемент «Аттик» по периметру здания, порошковая окраска, RAL9002 - Наружная одномаршевая лестница с площадкой, окраска RAL____

Электрика	- открытая в кабель-каналах, светильники светодиодные 28 Вт с учетом трех светильников на один блок-модуль; распределительный щиток с устройством защиты (УЗО), ВРУ, автоматические выключатели в каждой линии, выключатели и розетки накладные.
Вентиляция	- принудительные вытяжные вентиляторы с автоматическим жалюзи - приточный клапан КИВ
Система кондиционирования	- Сплит-система с учетом площади помещений (2 коэфл.)
Сопроводительная документация	- Сертификат соответствия на блок-модуль - Сертификат пожарный - Сертификаты на применяемые материалы - Паспорт модульного здания - Инструкция на модульное здание.

ГИП – начальник ОПС

Смирнов С.М.

53

Главный архитектор-начальник CAO

Мурашов С.В.

Согласовано:

Заместитель главного инженера
по строительству и ТО пр-ва

Щербаков А. В.
